

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS GUARULHOS
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO ÁGIL E DEFINIÇÃO DE TASKS

Tema 5 — Aplicativo de Gestão de Tarefas em Equipes e Projetos (TaskFlow)

Integrantes do Trio

Gustavo da Silva Coelho
Leonardo Alves de Oliveira
Raissa Carla Ferreira da Silva

Guarulhos, junho de 2026

1. LINKS DE ACESSO AO PROJETO

Como exigido para a validação das diretrizes de transparência e governança do projeto, seguem os links públicos atualizados para consulta da estrutura ágil e histórico de versionamento:

- **Link do Repositório Git (Código-Fonte):** <https://github.com/RaissaCarla/TaskFlow---Gest-o-de-Projetos-Mobile->
- **Link Público do GitHub Projects (Kanban):** <https://github.com/users/RaissaCarla/projects/5>

2. ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA DAS TASKS E RESPONSABILIDADES

As tarefas macro foram divididas de forma equilibrada entre o trio, mapeando as dependências lógicas de desenvolvimento (Back-end → Front-end → Testes) com estimativas de esforço baseadas em horas de desenvolvimento.

FASE 1: Fundação, Autenticação e Autorização

[Task 01] Setup do Projeto Mobile (React Native) e Repositório

Descrição: Inicializar o projeto mobile utilizando Expo e React Native. Configurar a estrutura de pastas do app, ferramentas de padronização (ESLint/Prettier) e o repositório oficial no GitHub com as branches main e develop.

Estimativa	4 horas
Prioridade	Alta
Dependências	Nenhuma
Responsável	Raissa Carla
Data de Entrega	23/06/2026

[Task 02] Modelagem do Banco de Dados e API de Autenticação (JWT)

Descrição: Criar a modelagem das entidades de Usuários, Projetos e Tarefas. Implementar a lógica de controle de acesso (Roles: USER e ADMIN), rotas de registro/login e geração de tokens JWT seguros.

Estimativa	8 horas
Prioridade	Alta
Dependências	Nenhuma
Responsável	Leonardo Alves
Data de Entrega	24/06/2026

[Task 03] UI - Tela de Login e Fluxo de Autenticação no App

Descrição: Desenvolver a interface visual da Tela de Login em React Native idêntica ao rascunho do Figma (projeto_wireframe.pdf). Integrar os campos com a API de autenticação e salvar o token JWT localmente utilizando AsyncStorage ou Expo SecureStore.

Estimativa	6 horas
Prioridade	Alta
Dependências	Task 01 e Task 02
Responsável	Gustavo da Silva
Data de Entrega	24/06/2026

FASE 2: Core do Sistema — Projetos e Tarefas

[Task 04] API - Endpoints de Projetos e Tarefas + Regras de Negócio

Descrição: Construir as rotas e controladores para o CRUD completo de Projetos e Tarefas. Aplicar a regra do enunciado: usuários comuns manipulam apenas suas respectivas tarefas/projetos. Usuários com a role ADMIN possuem acesso irrestrito e visão geral de todo o sistema.

Estimativa	10 horas
Prioridade	Alta
Dependências	Task 02
Responsável	Leonardo Alves
Data de Entrega	28/06/2026

[Task 05] UI - Tela de Projetos e Criação de Novos Projetos

Descrição: Criar a interface da tela “Meus Projetos” baseada nas referências visuais (projeto_wireframe.pdf). Exibir a listagem de projetos ativos, porcentagem de progresso geral e o botão “+ Novo” para a abertura do formulário de criação de projeto.

Estimativa	8 horas
Prioridade	Alta
Dependências	Task 03 e Task 04
Responsável	Raissa Carla
Data de Entrega	29/06/2026

[Task 06] UI - Tela de Listagem de Tarefas (Abas/Status)

Descrição: Desenvolver a tela de gerenciamento de tarefas dividida por abas de status (“A fazer”, “Em andamento” e “Concluída”). Garantir o feedback visual imediato para o usuário ao selecionar ou modificar o progresso de qualquer atividade do projeto.

Estimativa	8 horas
Prioridade	Alta
Dependências	Task 04 e Task 05
Responsável	Gustavo da Silva
Data de Entrega	29/06/2026

[Task 07] UI - Tela de Detalhes e Edição da Tarefa

Descrição: Implementar a tela detalhada de uma tarefa específica exibindo título, descrição, prazo final (seletor de data), membros atribuídos e campos editáveis. Restringir a permissão de exclusão ou alteração apenas aos criadores ou responsáveis pela demanda.

Estimativa	6 horas
Prioridade	Média
Dependências	Task 06
Responsável	Raissa Carla
Data de Entrega	01/07/2026

FASE 3: Testes e Validações Finais

[Task 08] Testes Unitários das Regras de Negócio com Jest

Descrição: Desenvolver a suíte de testes automatizados unitários utilizando o Jest. Cobrir cenários críticos de negócio descritos no projeto: validação de mudança de status de tarefas, consistência das permissões de acesso por Role (USER vs ADMIN) e vinculação correta de tarefas em projetos.

Estimativa	8 horas
Prioridade	Alta
Dependências	Task 04
Responsável	Leonardo Alves
Data de Entrega	03/07/2026

3. RASTREABILIDADE VIA REPOSITÓRIO GIT

Para cumprir a exigência de rastreabilidade do projeto, todas as tarefas listadas acima foram convertidas em Issues oficiais dentro do ecossistema do GitHub.

A conclusão de cada tarefa de implementação será automaticamente documentada através do vínculo com commits no repositório ou por meio de Pull Requests (PR/Merges) na branch de desenvolvimento (develop), utilizando palavras-chave de fechamento automatizado, como nos exemplos a seguir:

```
Closes #1      (para a Task 01)
Closes #2      (para a Task 02)
```

4. VISÃO GERAL DO BACKLOG / KANBAN

O quadro abaixo apresenta o status atualizado do GitHub Projects do TaskFlow, com as colunas Todo, In Progress e Done populadas com os cartões das tasks e as fotos dos integrantes responsáveis.

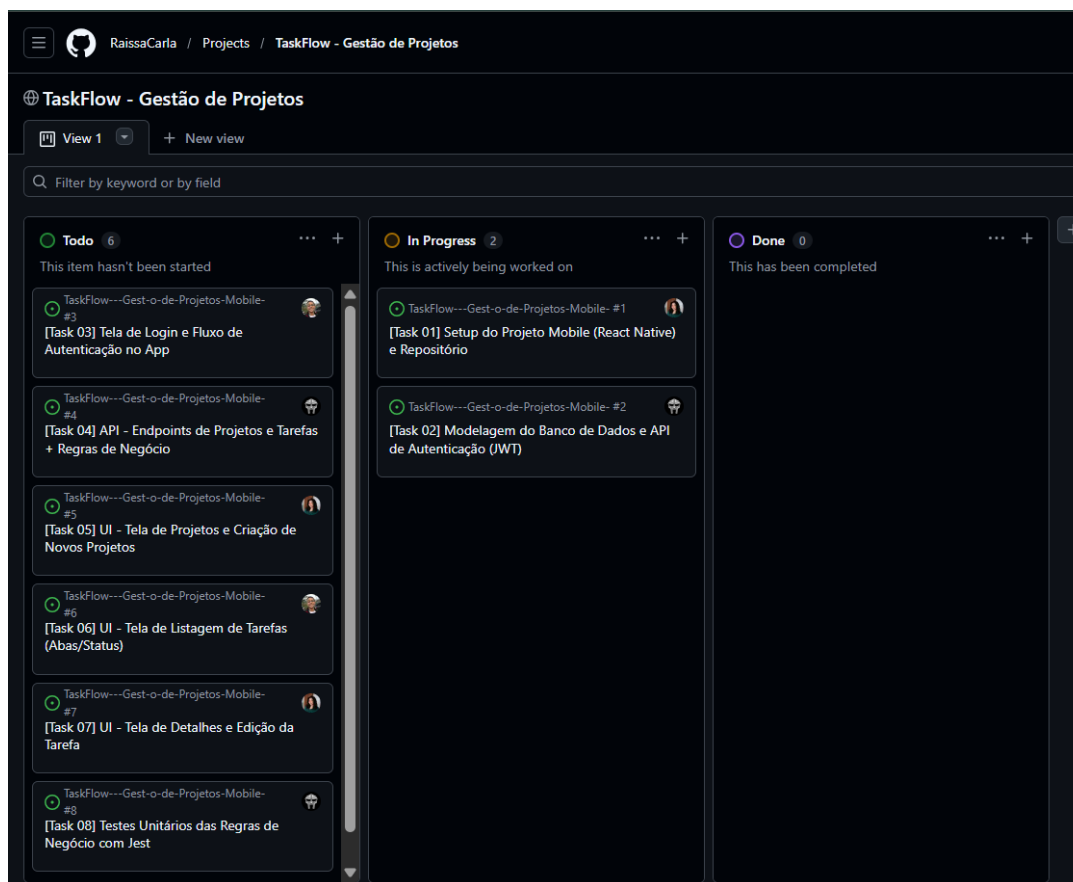


Figura 1 — Quadro Kanban do GitHub Projects (TaskFlow)

- **Acesso direto ao quadro:** <https://github.com/users/RaissaCarla/projects/5/views/1>
